

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Город», именуемое далее – Поставщик, в лице генерального директора Куприяновой Вероники Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Большечокинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемое далее - Заказчик, в лице главы Мельникова Сергея Вениаминовича, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работу и передать в установленный срок в собственность Заказчика конструкцию в соответствии с утвержденной сторонами спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (далее - работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить его.

1.2. На основании поданной Заказчиком заявки утверждается Спецификация.

1.3. Основным документом, подтверждающим поставку товара является универсальный передаточный документ (далее «УПД»). Подрядчик обязан направить в адреса Заказчика все необходимые отгрузочные документы в день поставки товара, а Заказчик обязан вернуть Подрядчику подписанные надлежащим образом «УПД» в течении 5 (пяти) дней с момента получения продукции.

1.4. Отгрузка товара производится со склада Продавца, находящегося по адресу: Чувашская Республика город Новочебоксарск улица Промышленная дом 12.

2. Цена контракта

2.1. Цена работ составляет 149000 (Сто сорок девять тысяч рублей 00 копеек) с НДС 20%. В цену работ включена стоимость доставки и монтажа изделий.

2.2. Количество и цена работ указываются в спецификации и накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта и устанавливаются по прайс-листу, действующему на момент получения выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Передать в собственность Заказчика Товар, соответствующий условиям настоящего Контракта

3.1.2. Передать Заказчику выполненные работы свободный от любых прав третьих лиц.

3.1.3. Гарантийный срок составляет 2 года с момента подписания акта приема-передачи товара.

3.2. Заказчик обязуется:


3.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.2.2. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.2.3. При обнаружении несоответствия выполненных работ требованиям настоящего контракта Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней и вызвать его представителя.

3.3. Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по передаче Товара в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, а также отказаться от исполнения настоящего контракта полностью или в части в случае просрочки оплаты выполненных работ или соответствующей ее части более чем на 30 календарных дней.

/В.А. Куприянова/



/С.В.Мельников

7. Порядок расчетов

4.1. Расчеты по контракту производятся Заказчиком на следующих условиях:

- авансовые расчеты по Контракту не предусмотрены;
- расчет осуществляется в течении 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке предусмотренного Контрактом

4.2. Источник финансирования: Республиканский бюджет – 89400,00 (Восемьдесят девять тысяч четыреста рублей 00 копеек), местный бюджет – 29 800,00 (Двадцать девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек), средства населения - 29 800,00 (Двадцать девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

4.3. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика.

5. Приемка работ

5.1. Срок, в пределах которого Подрядчик обязан передать Заказчику Товар, указывается в Спецификации.

5.2. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта приема-передачи. Подписание документа о принятии работ подтверждает факт отсутствия претензий по количеству, ассортименту, внешнему виду товара со стороны Заказчика на момент передачи Товара. Необоснованный отказ от подписания Акта приема-передачи не допускается. При отказе (уклонении) Заказчика от подписания Акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. В этом случае Выполненные работы считается принятым Заказчиком.

5.3. Претензии по качеству выполненных работ оформляются путем составления акта с участием представителя Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Контракту, если это имело место быть в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

6.3. По денежным обязательствам сторон, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

7. Заключительные положения

7.1. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего Контракта ему предоставлена вся необходимая для заключения Контракта информация о товаре, в том числе:

- о функциональном назначении;
- об основных потребительских свойствах товара;
- об адресе (месте нахождения) Подрядчика;
- о месте изготовления товара;
- о полном фирменном наименовании (наименовании) Подрядчика;
- о цене и об условиях приобретения товара, о порядке оплаты товара;
- о сроках, способах и условиях доставки товара;
- о сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке;
- о необходимости использования квалифицированных специалистов по подключению, наладке и

пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

7.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.3. Все споры между сторонами разрешаются между сторонами путем переговоров и в соответствии с действующим законодательством.

7.4. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

7.5. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

/В.А. Куприянова/

/ С.В.Мельников

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контрактуру действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по электронной почте, согласованной Сторонами в разделе "Подписи сторон", с последующим направлением по почте.

Подписи сторон:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«СК «Город»

Юридический адрес: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Промышленная ул, дом № 12, офис 2

Фактический адрес: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Промышленная ул, дом № 12, офис 2

ИНН 2130145748 **КПП** 212401001

р/сч 40702810675000007699

к/сч 30101810300000000609

БИК 049706609

Банк: Чувашское отделение №8613

ПАО Сбербанк г. Чебоксары

Тел.: (8352) 229-229

e-mail: centra-stroi@bk.ru

Генеральный директор
ООО СК «Город»

Администрация Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

Юридический адрес: 429410, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большие Чаки, пер.Механизаторов, д.5

Фактический адрес: 429410, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большие Чаки, пер. Механизаторов, д.5

ИНН 2114902542 **КПП** 211401001

ОГРН 1052137020704

р/сч: 40204810700000100228

л/сч: 03153002440

БИК: 049706001

Банк: Отделение – НБ Чувашская Республика

Тел. 8 (927) 847-91-99

e-mail: urmary_bchaki@cap.ru

Глава

Администрации Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики



_____/В.А. Куприянова/

_____/С.В.Мельников

Спецификация № 01 от 11.02.2020 года
к муниципальному контракту № 07 от 11.02.2020 года

г. Новочебоксарск

«11» февраля 2020 г.


Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Город», именуемое далее – Подрядчик, в лице генерального директора **Куприяновой Вероники Александровны,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемое далее - Заказчик, в лице главы **Мельникова Сергея Вениаминовича,** с другой стороны, далее по тексту настоящего Контракта совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Стороны согласовали следующие цены на Товар по Контракту:

№	Наименование товар, размерные характеристики	Ед. изм.	Колич ество	Стоимость за ед. изм., с НДС (20%), руб.	Общая стоимость с НДС (20%), руб.
<i>Стоимость изделия, в комплектации приведенной ниже</i>					
1.	Металлический блок-контейнер БКМ 4000*2400*2400/2700 (д*ш*в)	шт.	1	125 000	125 000
2.	Погрузка, доставка, выгрузка, монтаж изделий	шт.	1	24 000	24 000
Итого: 149 000 (Сто сорок девять тысяч рублей 00 коп. с НДС 20%)					


План
Блок-контейнер металлический
БКМ 4.0*2.4*2.4/2/7 м.

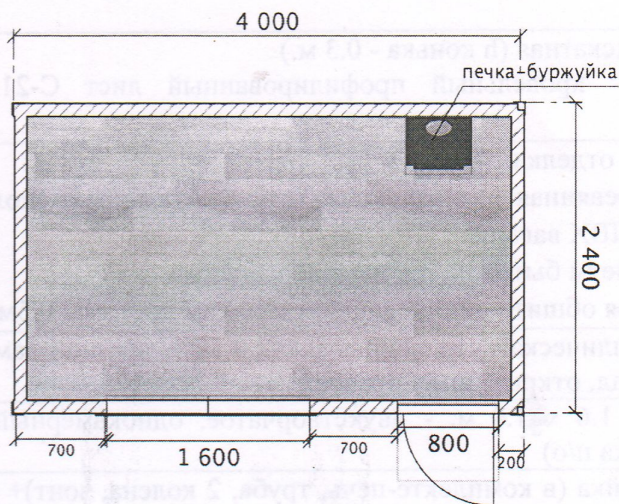

_____/В.А. Куприянова/

_____/С.В.Мельников/

3-D проект

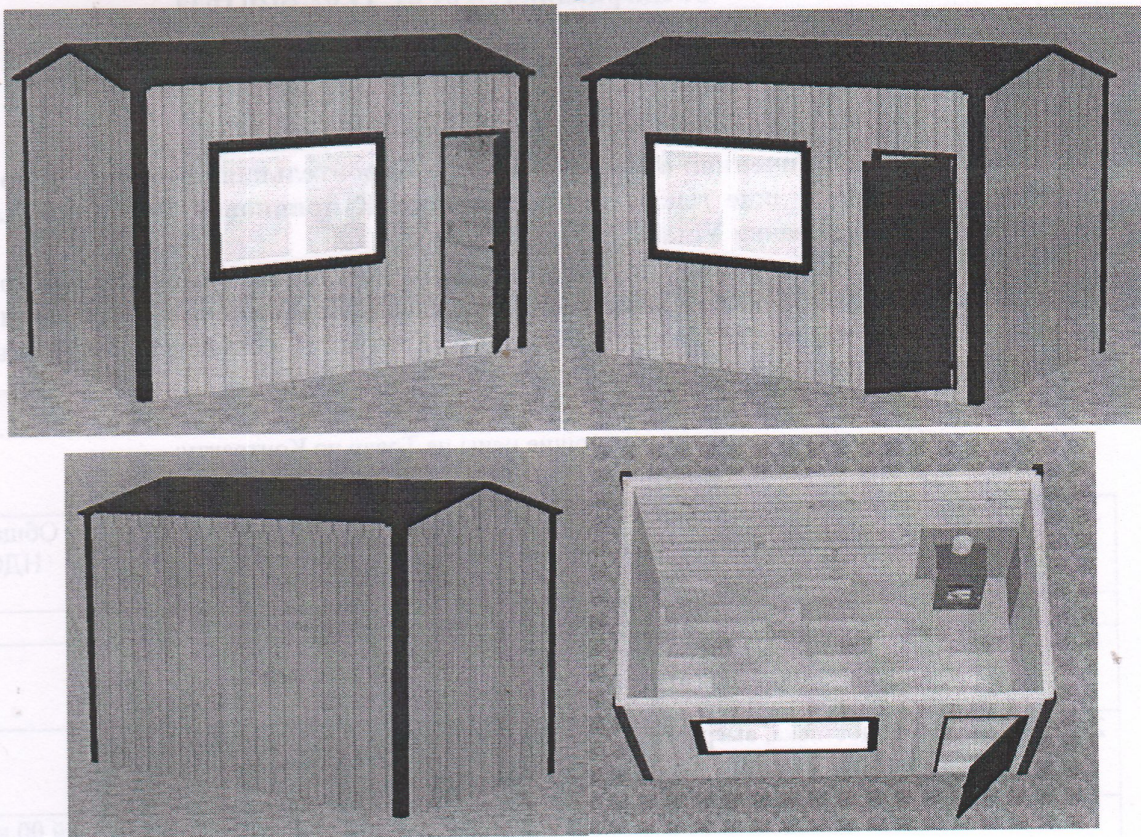

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Блок-контейнер металлический БКМ 4.0*2.4*2.4/2.7 м. Внешняя отделка: окрашенный профилированный лист С -9 (RAL 1014 слоновая кость) с доборными углами 100*100 (RAL 8017 шоколад), утеплитель 50 мм.	комп.	1
2	Крыша двухскатная (h конька - 0.3 м.) Покрытие - кровельный профилированный лист С-21 (RAL 8017 шоколад)	кв.м	9.6
3	Внутренняя отделка: Стены – деревянная вагонка «хвоя» - горизонтальное расположение Потолок - ПВХ вагонка Пол – линолеум бытовой, плинтус деревянный (Дно изделия обшито оцинкованным гладким листом – 0.5мм)	комп.	1
4	Дверь металлическая утеплённая 0.8*2.0 м. + врезной замок 100 (RAL 8017 шоколад, открывание - правое)	шт.	1
5	Окно ПВХ 1.6 x 1.0 м. - двухстворчатое, однокамерный стеклопакет (одна створка п/о)	шт.	1
6	Печь буржуйка (в комплекте-печь, труба, 2 колена, зонт)+ укладка ЦСП под печь	комп.	1
7	Электропроводка: отсутствует	-	-
8	Доставка+монтаж: ЧР, Урмарский район, д. Малые Чаки	комп.	1

Срок изготовления **15** рабочих дней.

Условия оплаты и отгрузки: оплата по выполненным работам после подписания акта приема -

объекта.

_____/В.А. Куприянова/

_____/С.В.Мельников/

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ выполненных работ

ЧР, Урмарский район, д. Большие Чаки

"__" _____ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Город», именуемое далее – Подрядчик, в лице генерального директора **Куприяновой Вероники Александровны**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемое далее – Заказчик, в лице главы **Мельникова С.В.**, с другой стороны, далее по тексту настоящего Контракта совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Муниципальным КОНТРАКТОМ № 07 от «11» февраля 2020 г. (далее- Контракт), Подрядчик выполнил обязательства, а именно: Поставка Металлических блок-контейнеров 4000*2400*2400/2700 (д*ш*в) – 1 штуки
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям КОНТРАКТА № 07 от «11» февраля 2020 г.
3. Вышеуказанные работы согласно Контракта должны быть выполнены «07» апреля 2020 г., фактически выполнены «__» _____ 2020 г.
4. Недостатки выполненных работ не выявлены
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику - в соответствии с условиями Контракта.
6. Результаты выполненных работ по Контракту: Поставка Металлических блок-контейнеров 4000*2400*2400/2700 (д*ш*в) – 2 штуки, произведена в полном объеме, соответствует условиям Контракта № 07 от «11» февраля 2020 г.
7. Техническая документация (Паспорта Металлические блок-контейнера 4000*2400*2400/2700 – 1 штуки, Копия Сертификата соответствия № 0543731 от « 27» августа 2019 г., Сертификат соответствия пожарной безопасности и качества № РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.01082, Сертификаты соответствия, сертификаты качества на используемые материалы.

Сдал:
Представители Подрядчика:

Принял:
Представители Заказчика:

Подрядчик:
ООО СК «Город»
Генеральный директор

Заказчик:
Глава
Администрации Большечакинского сельского
поселения Урмарского района ЧР

М.П

М.П



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

_____/В.А. Куприянова/

_____/С.В.Мельников/

Доставка и монтаж: ЧР, Урмарский район, д. Малые Чаки, монтаж производится на площадку, подготовленную Заказчиком. При доставке манипулятором Подрядчика, разгрузка осуществляется не более 1,5 м от машины, параллельно борту, не выше 1,5 м от уровня земли. При иных условиях разгрузки Заказчик предоставляет кран за свой счет. При разгрузке и подъезда спецтехники Поставщика подъездные пути должны быть очищены от снега и мусора.
Гарантийный срок 12 месяцев

Описание

1. **Каркас** металлический стальной высокопрочный, прямоугольный из сложного профиля заводского исполнения. Является основным несущим элементом. Нижний и верхний периметр из швеллера 100*50*3, потолочная лага и стойки усиления – швеллер 50*40*3, угловые стойки – угол г/к 63*63*5, окрашен грунт + эмаль в 2 слоя ХВ-0278. Соединения рам со стойками сварные. Жесткость каркаса в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных связей. Блок – контейнер имеет устройства (ушки), обеспечивающие безопасную и надежную перевозку и крепление на транспортных средствах.

2. **Крыша** - надстраиваемая, двускатная (высота конька - 300 мм): фермы из бруса 100*40 мм, покрытие кровельный окрашенный профилированный лист С-21 (толщина 0,5 мм), фронтоны - окрашенный профилированный лист С-9 (RAL 1014 - слоновая кость) слив наружный, неорганизованный. Потолочные лаги и деревянная обрешетка из бруса 40*100 естественной влажности. В качестве утеплителя используется минвата 50 мм. Для гидроизоляции, пароизоляции используется изоспан тип Д, изоспан тип В. Отделка потолка - ПВХ вагонка.

3. **Стены (снаружи – внутри):** В качестве стенового ограждения используется окрашенный профилированный лист С - 9 (RAL 1014 слоновая кость) с доборными углами 100*100 (RAL 8017 шоколад). Стеновые прогоны выполнены из деревянного бруса 100*40, стоек 100*40 мм естественной влажности. В качестве утеплителя используется минвата 50 мм. Для гидроизоляции, пароизоляции используется изоспан тип Д, изоспан тип В. Внутренняя отделка: Стены – деревянная вагонка «хвоя» - горизонтальное расположение, потолок - ПВХ вагонка,

4. **Пол (снизу – вверх):** днище обшито оцинкованным гладким листом – 0,5 мм, настил из доски необрезной 25 мм естественной влажности (черновой пол), 2 мм теплофол, минвата 50 мм, лаги поперечные 100*40, основание полов – доска необрезная 25 мм, теплофол 2 мм, ДСП 16 мм., линолеум бытовой, плинтус ПВХ.

5. **Вентиляция:** естественная

6. **Дверь:** входная металлическая утепленная 0,8*2,0 м.+ врезной замок.

7. **Окна ПВХ белые:** однокамерный стеклопакет

8. **Класс огнестойкости** -4

Назначение

Блок-контейнер представляет собой мобильное здание контейнерного типа. Блок-контейнер соответствует категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности - «4» (НПБ 105-03). Блок-контейнер может включать в себя все необходимое инженерное обеспечение (отопление, вентиляцию, электрическое освещение, водопровод, канализацию), а так же входную площадку.

Техническое описание

Размеры блок-контейнера соответствуют транспортным габаритам подвижного состава, предназначенного для эксплуатации по автомобильным дорогам РФ. Несущие конструкции имеют устройства для строповки при погрузочно-разгрузочных работах и рассчитаны на транспортные нагрузки.

Толщина утеплителя подобрана согласно СНиП 23-02-2003* «Тепловая защита зданий». Материал утеплителя экологически чистый, негорюч, при воздействии на него открытого пламени не выделяет токсичных веществ и неприятных запахов. Блок-контейнер изготавливается с учетом требований к материалам для строительных конструкций. Для несущих стальных конструкций применяется сталь С345-1 по ГОСТ 27772-88* «Прокат для строительных стальных конструкций» в соответствии с таблицей 50 СНиП II-23-81* «Стальные конструкции». Стальные конструкции запроектированы из стального профильного проката, труб и прямоугольного замкнутого профиля. Стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного профиля выполняются со

_____/В.А. Куприянова/

_____/С.В.Мельников/

сплошными швами и с заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить.

Металлопрокат, используемый для несущих стальных конструкций второй группы по таблице

50

СНиП II-23-81*, удовлетворяет требованиям хладостойкости КС U 40 (ударная вязкость по ГОСТ 9454-78* «Металлы - Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»). Требования по хладостойкости к металлу вспомогательных конструкций не предъявляются (табл. 2 Пособия к СНиП II-23-81*).

Блок-контейнер предназначен для обеспечения людей комфортными условиями работы и гигиены в обычных климатических подрайонах 1В, ПА и ША, с расчетной температурой окружающего воздуха от -30 до +40 градусов. Вес снегового покрова на кровле 150 кг/с/м, ветровое давление 46 кг/с/м

- Огнестойкость, степень – IV
- Расчетный срок службы, 20 лет
- Сейсмичность, баллов - 7
- Расчетная мощность электрооборудования, кВт – 6


Электропроводка

Блок-контейнер предусматривает искусственное рабочее освещение в соответствии с нормами и правилами СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» и ВСН 34-91 «Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения предприятий промышленности».


Подписи сторон:

Генеральный директор
ООО СК «Город»

Глава
Администрации Большечакинского
сельского поселения Урмарского района
Чувашской Республики



/В.А. Куприянова/



С.В.Мельников/

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ выполненных работ

ЧР, Урмарский район, д. Большие Чаки

"__" _____ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Город», именуемое далее – Подрядчик, в лице генерального директора **Куприяновой Вероники Александровны**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Администрация Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемое далее – Заказчик, в лице главы **Мельникова С.В.**, с другой стороны, далее по тексту настоящего Контракта совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Муниципальным КОНТРАКТОМ № 07 от «11» февраля 2020 г. (далее-Контракт), Подрядчик выполнил обязательства, а именно: Поставка Металлических блок-контейнеров 4000*2400*2400/2700 (д*ш*в) – 1 штуки

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям КОНТРАКТА № 07 от «11» февраля 2020 г.

3. Вышеуказанные работы согласно Контракта должны быть выполнены «07» апреля 2020 г., фактически выполнены «__» _____ 2020 г.

4. Недостатки выполненных работ не выявлены

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику - в соответствии с условиями Контракта.

6. Результаты выполненных работ по Контракту: Поставка Металлических блок-контейнеров 4000*2400*2400/2700 (д*ш*в) – 2 штуки, произведена в полном объеме, соответствует условиям Контракта № 07 от «11» февраля 2020 г.

7. Техническая документация (Паспорта Металлические блок-контейнера 4000*2400*2400/2700 – 1 штуки, Копия Сертификата соответствия № 0543731 от «27» августа 2019 г., Сертификат соответствия пожарной безопасности и качества № РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.01082, Сертификаты соответствия, сертификаты качества на используемые материалы.

Сдал:
Представители Подрядчика:

Принял:
Представители Заказчика:

Подрядчик:
ООО СК «Город»
Генеральный директор

Заказчик:
Глава
Администрации Большечакинского сельского
поселения Урмарского района ЧР

М.П

М.П



В. А. Купринова

С. В. Мельников

_____/В.А. Куприянова/

_____/С.В.Мельников/
